

## RECURSO HUMANO

### ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

- 1 Superintendente de proyecto
- 2 Residentes de proyecto
- 4 Asistente de ingeniería

### ENCARGADOS DE OBRA

- 0 Encargado de maquinaria:
- 4 Maestro de obras:
- 3 Administrador de bodega:

### OPERATIVOS

- 1 Operadores de maquinaria
- 2 Operador de torre grua
- 11 Ayudantes
- 28 Total del equipo de trabajo

EGRESADOS QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE EJECUCIÓN

4

TOTAL DE COLABORADORES EN OBRA

281

## EQUIPO

2 TORRE GRUA



0 EXCAVADORA



0 TROEXCAVADORA



0 MINI EXCAVADORA



0 MINI CARGADOR




1 BOMBA PARA CONCRETO



## METAS SEMANA 15

1	FUNDICIÓN DE LOSA NIVEL 1, SECTOR 1.-
2	ENTARIMADO Y ARMADO DE ACERO, LOSA NIVEL 1, FASE 2.
3	ENTARIMADO Y ARMADO DE ACERO, LOSA NIVEL 1, FASE 3.-
4	FUNDICIÓN DE LOSA, SÓTANO3, SECTOR 4.-
5	ARMADO DE COLUMNAS, SÓTANO 3, SECTOR 5.-
6	FUNDICIÓN DE MUROS DE CISTERNA DE AGUA POTABLE.-

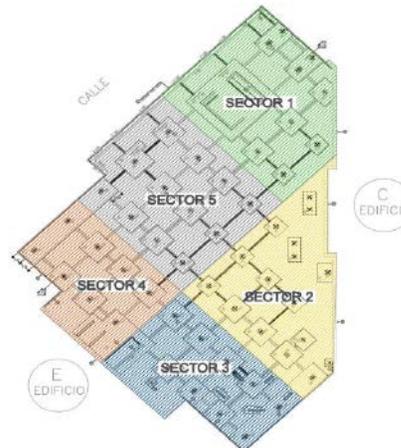

## AVANCE A LA SEMANA 14

### MOVIMIENTO DE TIERRAS

100%

1,010 M<sup>3</sup>

100%

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONCRETO ESTRUCTURAL

NAILING + SHOTCRETE

525,000

100%

100%

KG. DE ACERO

MUROS NAILING

PILOTES

### OBRA GRIS

100%

100%

645 ML

ZAPATAS ARMADURÍA

ZAPATAS FUNDICIÓN

COLUMNAS ARMADURÍA

550 ML

29,930

6,259.75

COLUMNAS FUNDICIÓN

ACERO ESTRUCTURAL

M<sup>3</sup> CONCRETO ESTRUCTURAL

NÚMERO DE PLANOS QUE CONFORMAN LA PLANIFICACIÓN DE ESTE PROYECTO

599

DÍAS SIN ACCIDENTES

196

# NIVEL 03



## INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Social Innovation Lab  
Aula de comunicación audiovisual  
Espacios colaborativos  
Co-work Space  
Makerspace para Proyectos y Comunidad  
Makespace STEAM  
Laboratorio de Innovación Educativa  
Biblioteca  
HUB de investigación

