



AREAS DE AMBIENTES

	AREA (EN M ²)
CO-WORK DOCENTE	124.46
AULA SOCRAICA 4	100.85
MAKERSPACE PROYECTOS Y COMUNIDAD	196.35
LABORATORIO DE INNOVACION EDUCATIVA	124.30
AULA DE INNOVACION SOCIAL	91.15
SALA PRESENTACION 1	42.32
SALA PRESENTACION 2	42.90
MAKERSPACE STEAM	272.31
ZONA MULTIMEDIA MAKERSPACE DE PROYECTOS	101.62
COLECCIONES SHOOK	108.07
FILM	26.42
TOLLAN	33.96
CAFE	154.67
AREA DE LECTURA	87.70
BIBLIOTECA	900.65
SALA DE CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS	71.45
ARCHIVO	153.58

A-13 PLANTA AMUEBLADA NIVEL 3 INVESTIGACION Y DESARROLLO
CENTRO DE INNOVACION Y TECNOLOGIA UVG



seisarquitectos

darcon
taller de arquitectura

RECURSO HUMANO

AVANCE A LA SEMANA 22

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

- 1 Superintendente de proyecto
- 2 Residentes de proyecto
- 5 Asistente de ingeniería
- 1 Gestor de seguridad industrial

ENCARGADOS DE OBRA

- 3 Maestro de obras:
- 3 Administrador de bodega:

OPERATIVOS

- 2 Operadores de grúas y Operador de retroexcavadora
- 1 Operadores de bomba de concreto
- 15 Ayudantes
- 33 Total del equipo de trabajo

EGRESADOS QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE EJECUCIÓN

7

TOTAL DE COLABORADORES EN OBRA

297

EQUIPO

2 TORRE GRUA



0 EXCAVADORA



0 TROEXCAVADORA



0 MINI EXCAVADORA



0 MINI CARGADOR



1 BOMBA PARA CONCRETO



MOVIMIENTO DE TIERRAS

100%

1,010 M³

100%

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONCRETO ESTRUCTURAL

NAILING + SHOTCRETE

525,000

100%

100%

KG. DE ACERO

MUROS NAILING

PILOTES

OBRA GRIS

100%

100%

975 ML

ZAPATAS ARMADURÍA

ZAPATAS FUNDICIÓN

COLUMNAS ARMADURÍA

805 ML

45,250

11,019


COLUMNAS FUNDICIÓN

ACERO ESTRUCTURAL

M³ CONCRETO ESTRUCTURAL

METAS SEMANA 23

1	Fundición de losa, Nivel 3, Sector 1.-
2	Nivel de plaza, Sector 2.-
3	Fundición de columnas, Nivel 2, Sector 3.-
4	Fundición de columnas a doble altura primera etapa, Sector 4.-
5	Fundición de columnas a doble altura primera etapa, Sector 5.-
6	Fundición de rampa, Acceso Principal.-

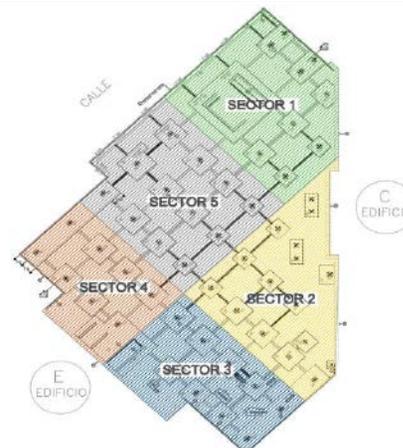

NÚMERO DE PLANOS QUE CONFORMAN LA PLANIFICACIÓN DE ESTE PROYECTO

599

DÍAS SIN ACCIDENTES

48
