



UVG
UNIVERSIDAD
DEL VALLE
DE GUATEMALA

UVG
DEL VALLE
GRUPO EDUCATIVO

CIT
CENTRO
DE INNOVACIÓN
& TECNOLOGÍA

RECURSO HUMANO

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

- 1 Superintendente de proyecto
- 2 Residentes de proyecto
- 4 Asistente de ingeniería
- 1 Gestor de seguridad industrial

ENCARGADOS DE OBRA

- 3 Maestro de obras:
- 3 Administrador de bodega:

OPERATIVOS

- 2 Operadores de grúas y Operador de retroexcavadora
- 1 Operadores de bomba de concreto
- 15 Ayudantes
- 32 Total del equipo de trabajo

EGRESADOS QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE EJECUCIÓN

7

TOTAL DE COLABORADORES EN OBRA

319

EQUIPO

2 TORRE GRUA



0 EXCAVADORA



0 TROEXCAVADORA



0 MINI EXCAVADORA



0 MINI CARGADOR




1 BOMBA PARA CONCRETO



METAS SEMANA 30

1	Entarimado y armado de losa, Nivel 6, Sector 1.-
2	Nivel de plaza, Sector 2.-
3	Fundición de losa, Nivel 5, Sector 3.-
4	Fundición de losa, Nivel 4, Sector 4.-
5	Entarimado y armado de losa, Nivel 5, Sector 5.-

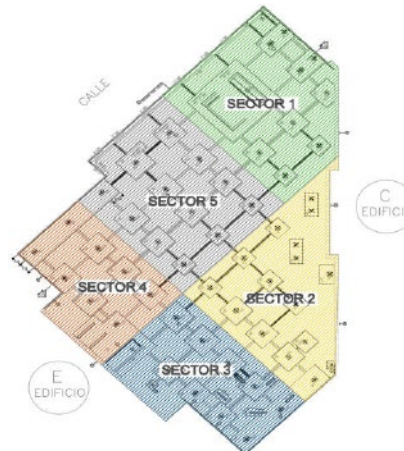

AVANCE A LA SEMANA 29

MOVIMIENTO DE TIERRAS

100%

1,010 M³

100%

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONCRETO ESTRUCTURAL

NAILING + SHOTCRETE

525,000

100%

100%

KG. DE ACERO

MUROS NAILING

PILOTES

OBRA GRIS

100%

100%

1,594 ML

ZAPATAS ARMADURÍA

ZAPATAS FUNDICIÓN

COLUMNAS ARMADURÍA

1,562 ML

51,901.94

14,902.5

COLUMNAS FUNDICIÓN

QQ
ACERO ESTRUCTURAL

M³
CONCRETO ESTRUCTURAL

NÚMERO DE PLANOS QUE CONFORMAN LA PLANIFICACIÓN DE ESTE PROYECTO

599

DÍAS SIN ACCIDENTES

97
