



UVG
UNIVERSIDAD
DEL VALLE
DE GUATEMALA



CIT
CENTRO
DE INNOVACIÓN
& TECNOLOGÍA

RECURSO HUMANO

AVANCE A LA SEMANA 32

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

- 1 Superintendente de proyecto
- 2 Residentes de proyecto
- 4 Asistente de ingeniería
- 1 Gestor de seguridad industrial

ENCARGADOS DE OBRA

- 3 Maestro de obras:
- 3 Administrador de bodega:

OPERATIVOS

- 2 Operadores de grúas y Operador de retroexcavadora
- 1 Operadores de bomba de concreto
- 15 Ayudantes
- 32 Total del equipo de trabajo

EGRESADOS QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE EJECUCIÓN

7

TOTAL DE COLABORADORES EN OBRA

430

EQUIPO

2 TORRE GRUA



0 EXCAVADORA



0 TROEXCAVADORA



0 MINI EXCAVADORA



0 MINI CARGADOR



1 BOMBA PARA CONCRETO



MOVIMIENTO DE TIERRAS

100%

1,010 M³

100%

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONCRETO ESTRUCTURAL

NAILING + SHOTCRETE

525,000

100%

100%

KG. DE ACERO

MUROS NAILING

PILOTES

OBRA GRIS

100%

100%

1,765.9

ZAPATAS ARMADURÍA

ZAPATAS FUNDICIÓN

ML COLUMNAS ARMADURÍA

1,757.1

60,985.8

16,854.75


ML COLUMNAS FUNDICIÓN

QQ ACERO ESTRUCTURAL

M³ CONCRETO ESTRUCTURAL

METAS SEMANA 33

1	Entarimado y armado de losa, Nivel 7, Sector 1.-
2	Nivel de plaza, Sector 2.-
3	Fundición de columnas, Nivel 6, Sector 3.-
4	Fundición de losa, Nivel 5, Sector 4.-
5	Entarimado de losa, Nivel 6, Sector 5.-

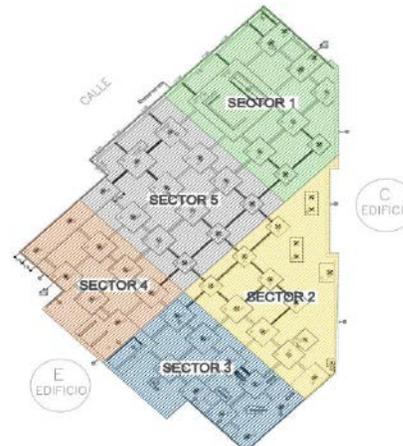

NÚMERO DE PLANOS QUE CONFORMAN LA PLANIFICACIÓN DE ESTE PROYECTO

599

DÍAS SIN ACCIDENTES

118
