



UVG
UNIVERSIDAD
DEL VALLE
DE GUATEMALA

EL MIRADOR DEL CIT

CIT
CENTRO
DE INNOVACIÓN
& TECNOLOGÍA

59

Semanas de
construcción

790

Colaboradores
en obra

1,010 m³

de concreto en movimientos de tierra

20,951 m³

de concreto en obra gris

243,393

metros lineales de cable eléctrico
(conductores diferentes calibres)

4,000

personas podrán interactuar

En esta semana estructura secundaria,
instalaciones y acabados en nivel 2

RECURSO HUMANO

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

- 1 Superintendente de proyecto
- 2 Residentes de proyecto
- 4 Asistentes de ingeniería
- 1 Gestor de seguridad industrial

ENCARGADOS DE OBRA

- 3 Maestros de obras
- 3 Administradores de bodega

OPERATIVOS

- 2 Operador de grúa y
Operador de retroexcavadora
- 1 Operador de bomba de concreto
- 15 Ayudantes

32 Total del equipo de trabajo

EGRESADOS QUE
CONFORMAN EL EQUIPO
DE EJECUCIÓN

7

TOTAL DE
COLABORADORES
EN OBRA

790

EQUIPO

1 TORRE GRUA





AVANCE SEMANA 58

Sector Construcción



METAS SEMANA 59

Estructura Secundaria, Instalaciones y Acabados

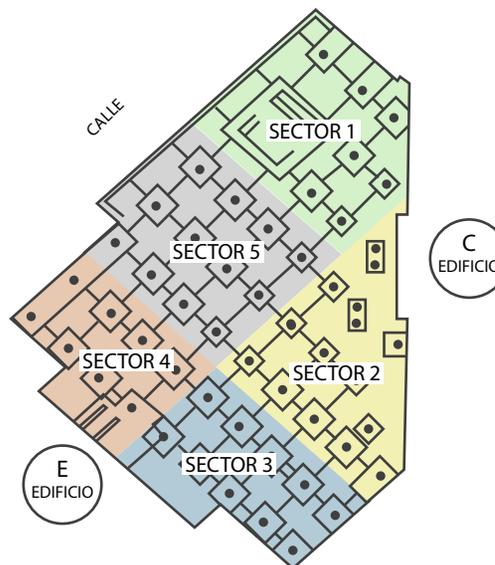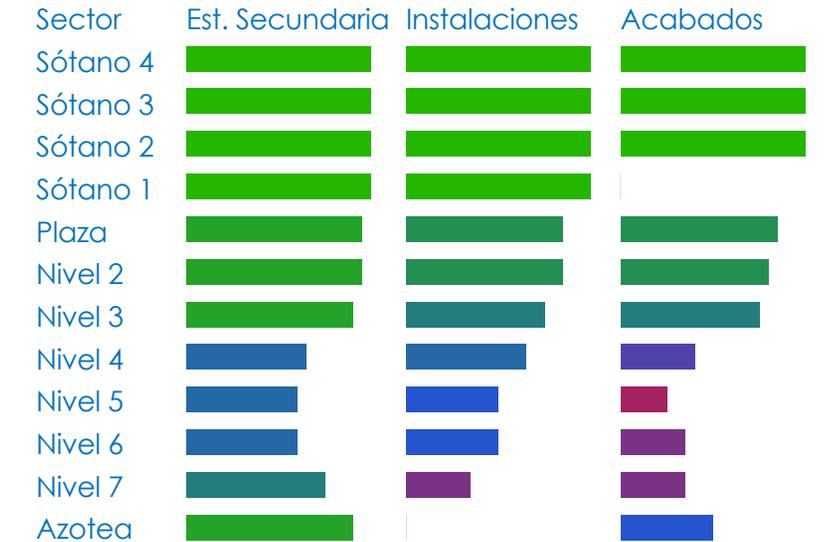

Estructura Principal

1	Nivel de Azotea, Sector 1.-
2	Nivel de Plaza, Sector 2.-
3	Nivel de Azotea, Sector 3.-
4	Nivel de Azotea, Sector 4.-
5	Nivel de Azotea, Sector 5.-

NÚMERO DE PLANOS
QUE CONFORMAN LA
PLANIFICACIÓN DE ESTE
PROYECTO

599
